

SO.1710.1.2025

**RAPORT Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH  
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020**

URZĄD GMINY ŚLĘMIEŃ R-01/344  
WPLYNEŁO DNIA:

Rodzaj dokumentu:

Oryginał  Kopia  Korekta

ZNAK SPRAWY

NUMER DOKUMENTU

NR IDENTYFIKACYJNY

UM12-65151-  
UM1200307/22

12/7.2.1/0001/25

0 6 2 3 1 2 1 0 5

Zarejestrowano pod nr 130  
L. zar. (POPIIS)

**I. DANE NA TEMAT KONTROLI (wg UM)**

|  |   |                          |   |
|--|---|--------------------------|---|
| Nazwa poddziałania:                                      | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii       | Data otrzymania zlecenia | Zlecenie z dnia: 10.12.2024<br>Typowanie z dn. dd/mm/rrrr |
| Nazwa operacji:  | Przebudowa drogi wraz budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8-061 do km 10+798 |                          |   |
| Data złożenia wniosku o płatność:                        | 2024-09-27  |                          |   |
| 1. Rodzaj czynności kontrolnych:                         |   |                          |   |
| 1. Wizyta na zlecenie                                    |   |                          | 1 <input type="checkbox"/>                                |
| 2. Kontrola na miejscu w wyniku typowania                |   |                          | 2 <input checked="" type="checkbox"/>                     |
| 3. Kontrola zlecona manualnie                            |   |                          | 3 <input type="checkbox"/>                                |
| 4. Kontrola ex post/kontrola zobowiązań wieloletnich     |   |                          | 4 <input type="checkbox"/>                                |
| 5. Kontrola zadania niematerialnego w trakcie realizacji |   |                          | 5 <input type="checkbox"/>                                |
| 6. Kontrola uzupełniająca                                |   |                          | 6 <input type="checkbox"/>                                |
| 7. Wizyta uzupełniająca                                  |   |                          | 7 <input type="checkbox"/>                                |
| Czynności kontrolne dotyczą etapu:                       |   |                          |   |
| 1. Obsługi wniosku o przyznanie pomocy                   |   |                          | 1 <input type="checkbox"/>                                |
| 2. Po złożeniu IoM                                       |   |                          | 2 <input type="checkbox"/>                                |
| 3. Obsługi wniosku o płatność                            |   |                          | 3 <input checked="" type="checkbox"/>                     |
| 4. Ex-post/zobowiązań wieloletnich                       |   |                          | 4 <input type="checkbox"/>                                |
| 2. Metoda typowania (AR/LOS/MAN)                         | AR  |                          |   |
| 3. Przeprowadzający kontrolę                             | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego   |                          |   |

**II. DANE PODMIOTU KONTROLOWANEGO**

|   |                               |                         |
|---|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Nazwa podmiotu kontrolowanego  | Gmina Ślemień                 |                         |
| NIP   | 5 5 3 2 5 1 1 9 6 2           | REGON 0 7 2 1 8 2 7 0 0 |
| 2. Adres zamieszkania/siedziby podmiotu kontrolowanego                          | Województwo                   | śląskie                 |
|   | Powiat/gmina                  | żywiecki Ślemień        |
|   | Miejscowość/kod               | Ślemień 34-323          |
|   | Ulica/nr domu /lokalu/działki | Krakowska 148           |
|   | Tel.                          | 33 865 40 98 Fax -      |
|   | E-mail                        | sekretariat@slemiesn.pl |
| 3. Adres korespondencyjny (należy wypełnić w przypadku, gdy inny od powyższego) | Województwo                   | -                       |
|   | Powiat/gmina                  | -                       |
|   | Miejscowość/kod               | -                       |
|   | Ulica i nr domu/lokalu        | -                       |



**III. OSOBA UPOWAŻNIONA DO REPREZENTACJI (PEŁNOMOCNIK/OSOBA REPREZENTUJĄCA)**

|    |                 |   |                    |   |
|----|-----------------|---|--------------------|---|
| 1. | Imię i Nazwisko | - | Stanowisko/funkcja | - |
| 2. | Imię i Nazwisko | - | Stanowisko/funkcja | - |

Informacje uzyskane w wyniku kontroli stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

**IV. POWIADOMIENIE O CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

|    |  |                      |                                     |            |                    |                      |
|----|--|----------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| 1. | Powiadomienie o kontroli<br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Sposób powiadomienia |                                     | Data       | Osoba powiadamiana | Osoba powiadamiająca |
|    |  | Telefon              | <input checked="" type="checkbox"/> |            |                    |                      |
|    |  | List polecony        | <input type="checkbox"/>            |            |                    |                      |
|    |  | Inne .....           | <input type="checkbox"/>            |            |                    |                      |
|    |  |                      |                                     | 03.01.2025 | Anna Stokłosa      | Ilona Mazur          |

**V. PRZEWODZENIE CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Kontrola została zrealizowana?<br>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> | Jeśli NIE podać przyczynę: nie dotyczy |
|----|--|--|

**VI. DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W CZYNNOŚCIACH KONTROLNYCH**

|    |                      |          |                 |   |
|----|----------------------|----------|-----------------|---|
| 1. | Kontrolujący         | Imię     | Nazwisko        | Nr upoważnienia i data jego wystawienia |
|    | Inspektor terenowy:  | Marta    | Łukasik-Łopatka | 00220/15 z dn. 11.08.2015 r.            |
|    | Inspektor terenowy:  | Ilona    | Mazur           | 00218/15 z dn. 11.08.2015 r.            |
| 2. | Podmiot kontrolowany | Imię     | Nazwisko        | Rodzaj dokumentu tożsamości             |
|    |                      | Jarosław | Krzak           | Dowód osobisty                          |

**VII. UWAGI**

Uwagi kontrolujących ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

W dniu 18/12/2024 r. beneficjent przesłał pismo z prośbą o przesunięcie kontroli na m-c styczeń 2025.



**VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH**

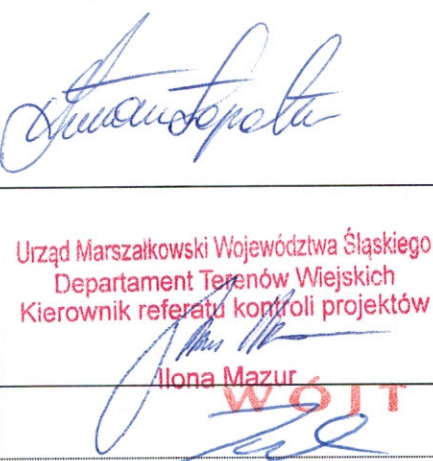

|     |   |
|-----|---|
| 1.  | Lista kontrolna   |
| 2.  | Wydruk z dn. 03.01.2025 – Kartoteka środków trwałych<br>Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych- analityka rejestr 092 (w dyspozycji SW)    |
| 3.  | Kopia wykazu faktur (w dyspozycji SW).  |
| 4.  | Dokumentacja zdjęciowa (w dyspozycji SW)<br>Kopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW) |
| 5.  |   |
| 6.  |   |
| 7.  |   |
| 8.  |   |
| 9.  |   |
| 10. |   |

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych         | 07.01.2025 r. godz. 9:00<br><i>data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych</i>   | 08.01.2025 r. godz. 14:00<br><i>data i godzina zakończenia czynności kontrolnych</i>                                  |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych                  | -   |   |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu                          | 08.01.2025 r.<br><i>dd/mm/rrrr</i>  | Ślemień<br><i>Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych</i>  |
| Kontrolujący   | Imię  | Nazwisko  |
|  | Marta   | Łukasik-Łopatka   |
| Podmiot kontrolowany   | Ilona   | Mazur   |
|  | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>Departament Terenów Wiejskich<br>Kierownik referatu kontroli projektów<br>Ilona Mazur<br> |   |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | 08.01.2025<br><i>data otrzymania Raportu</i>  | <br>Józef Kizak<br><i>podpis</i> |



### VIII. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH




|     |   |
|-----|---|
| 1.  | Lista kontrolna   |
| 2.  | Wydruk z dn. 03.01.2025 – Kartoteka środków trwałych<br>Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych- analityka rejestr 092 (w dyspozycji SW)    |
| 3.  | Kopia wykazu faktur (w dyspozycji SW).  |
| 4.  | Dokumentacja zdjęciowa (w dyspozycji SW)<br>Kopia kosztorysu powykonawczego z zaznaczonymi elementami zweryfikowanymi w terenie (w dyspozycji SW) |
| 5.  |   |
| 6.  |   |
| 7.  |   |
| 8.  |   |
| 9.  |   |
| 10. |   |

**Podstawa prawna:**

Czynności kontrolne przeprowadzone w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 z późn. zm).

**Pouczenie:**

W przypadku gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie z czynności kontrolnych może zgłosić jednostce kontrolującej umotywowane uwagi na piśmie do ustaleń w nim zawartych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia kopii raportu z czynności kontrolnych, chyba że bezpośrednio po zakończeniu czynności kontrolnych podmiot kontrolowany zgłosił kontrolującemu umotywowane uwagi, co do ustaleń zawartych w tym raporcie.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych         | 07.01.2025 r. godz. 9:00                          |  | 08.01.2025 r. godz. 14:00   |
|  | data i godzina rozpoczęcia czynności kontrolnych  |  | data i godzina zakończenia czynności kontrolnych  |
| Przerwy w wykonywaniu czynności kontrolnych                  | okresy przerw w wykonywaniu czynności kontrolnych |  |   |
| Data i miejsce sporządzenia Raportu                          | 08.01.2025 r.                                     | Ślemień  |   |
|  | dd/mm/rrrr  | Miejsce sporządzenia Raportu z czynności kontrolnych |   |
| Kontrolujący   | Imię  | Nazwisko   | Podpis  |
|  | Marta   | Łukasik-Łopatka                                      |   |
|  | Ilona   | Mazur  | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego<br>Departament Terenów Wiejskich<br>Kierownik referatu kontroli projektów<br><br>Ilona Mazur |
| Podmiot kontrolowany   | 08.01.2025  |  | <br>WÓJT<br>Jacek Kizak  |
|  | data otrzymania Raportu                           |  | podpis  |
| Adnotacja o niepodpisaniu raportu przez podmiot kontrolowany | Bez uwag  |  |   |



|   |                         |                |
|---|-------------------------|----------------|
| Znak sprawy:  | UM12-65151-UM1200307/22 | K-02/7.2.1/344 |
| <b>LISTA KONTROLNA DO<br/>RAPORTU Z CZYNNOCI KONTROLNYCH<br/>PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020</b> |                         |                |
| <b>Nr Raportu z czynności kontrolnych</b>   |                         | <b>z dnia</b>  |
| 12/7.2.1/0001/25  |                         | 08.01.2025     |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Działanie</b>    | <b>Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich</b>   |
| <b>Poddziałanie</b> | <b>Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</b>       |
| <b>Operacja</b>     | <i>Przebudowa drogi wraz budową chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień od km 8-061 do km 10+798</i> |

| Lp.  | Przedmiot weryfikacji                   | Dane podmiotu kontrolowanego   |       | Ocena zgodności ze stanem faktycznym |     |    | Uwagi kontrolujących   |
|--|---|--|-------|--------------------------------------|-----|----|--|
|  |   | Jedn. miary  | Ilość | TAK                                  | NIE | ND |  |
| 1.   | Zgodność lokalizacji operacji.          | Śląskie, żywiecki, gm. Ślemień, m. Ślemień, ulica: Krakowska, DP 1413S |       | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 1,2,7. Lokalizację operacji potwierdzono w dn. 08.01.2025 na stronie www.geoportal.gov.pl |
| Zgodność zestawienia rzeczowo-finansowego z zakresem realizacji operacji.  |   |  |       |                                      |     |    |  |
| <b>I. Koszty inwestycyjne.</b>   |   |  |       |                                      |     |    |  |
| <b>A Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1413 S w miejscowości Ślemień</b>   |   |  |       |                                      |     |    |  |
| 1)   | Roboty początkowe                       | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 2)   | Roboty przygotowawcze                   | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 3)   | Korytowanie                             | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 4)   | Roboty wykończeniowe                    | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 5)   | Podbudowy                               | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 6)   | Nawierzchnie                            | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7 oraz wizja w miejscu  |
| 7)   | Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu                                      |
| <b>B Budowa chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 1413 S przy ulicy Krakowskiej w miejscowości Ślemień odcinek od km 8-061 do km 10+798</b> |   |  |       |                                      |     |    |  |
| 1)   | Roboty przygotowawcze                   | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 2)   | Roboty rozbiórkowe                      | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |
| 3)   | Roboty ziemne                           | kpl  | 1     | X                                    |     |    | Lista dokumentów pkt 4,5,7   |



|     |   |     |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| 4)  | Chodniki i zjazdy   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu |   |
| 5)  | Nawierzchnia jezdni, skrzyżowania   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu |   |
| 6)  | Kanalizacja deszczowa   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu |   |
| 7)  | Urządzenie bezpieczeństwa ruchu   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu |   |
| 8)  | Rury ochronne – sieci podziemne   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dok. pkt 4,5,7  |   |
| 9)  | Roboty budowlane w zakresie zatoczek autobusowych   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu |   |
| 10) | Odbudowa ogrodzeń   | kpl | 1 | X |   |   | Lista dokumentów pkt 4,5,7 załącznik nr 4 do raportu oraz wizja w miejscu |   |
| 11) | Inne zadania  | kpl | 1 | X |   |   | Lista dok. pkt 4,5,7  |   |
| II. | Koszty ogólne.  |     |   |   |   |   |   |   |
| 1)  | Nadzór inwestorski  | kpl | 1 | X |   |   | Lista dok. pkt 4,5,6  |   |
| 3.  | Zgodność dokumentów finansowo-księgowych z wykazem faktur lub innych dowodów o równoważnej wartości dowodowej.  |     |   |   |   | X |   | Lista dok. pkt 4, załącznik nr 3 do raportu. Pozycja 6, kolumna 9 wykazu faktur- błędnie wpisana data zapłaty. Jest 29.01.2024, powinno być 29.02.2024. |
| 4.  | Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla transakcji związanych z realizacją operacji.   |     |   |   | X |   |   | Lista dok. pkt 3,4 Załącznik nr 2 do raportu  |
| 5.  | Nieprzeniesienie posiadania lub prawa własności nabytych dóbr, na które została przyznana i wypłacona pomoc.  |     |   |   | X |   |   | Lista dok. pkt 3 Załącznik nr 2 do raportu  |
| 6.  | Wykorzystanie operacji zgodnie z przeznaczeniem.  |     |   |   | X |   |   | Wizja w miejscu   |
| 7.  | Realizacja działań informacyjno- promocyjnych.  |     |   |   | X |   |   | Załącznik nr 4 do raportu   |
| 8.  | Przechowywanie dokumentacji związanej z przyznaną pomocą.   |     |   |   | X |   |   | Lista dokumentów  |
| 9.  | Brak finansowania kosztów kwalifikowanych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe. |     |   |   | X |   |   | Lista dok. pkt 4  |

#### Uwagi kontrolujących:

Potwierdzono długość przebudowanej drogi określoną w aneksie nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy tj. 2,79 km. Pomiaru w terenie dokonano za pomocą dystansometru (Digi Roller IIplus).

- Umowa o przyznaniu pomocy nr 00259-65151-UM1200307/22 z dnia 29/03/2023, wraz z aneksem nr 1 z dnia 28.03.2024 r., aneks nr 2 z dnia 25.09.2024 r.,



2. Decyzja nr 1396/2019 z dnia 02/12/2019 r. zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę (budowa chodnika i kanalizacji deszczowej 8+059-9+598).  
Zawiadomienie o zakończeniu budowy budowli z dnia 30/08/2024 r. ( długość 2790)  
Zawiadomienie o zakończeniu budowy budowli z dnia 30/08/2024 r. ( długość 1537, szerokość 2,25)  
Zaświadczenie PINB z dnia 13/09/2024 r. o nie wniesieniu sprzeciwu (dot. budowy chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej).  
Pismo z PINB dot. przebudowy drogi z dnia 10/09/2024 r.  
Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych z dnia 21/06/2022 r. ( droga powiatowa nr 1413S ul. Krakowska w Ślemieniu dla zadania: *Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1413 S w miejscowości Ślemień od km 8-061 do km 10+798*)  
Porozumienie z dn. 15/06/2022 r. ( powierzenie wykonania zadnia publicznego) wraz z 3 aneksami.
3. Zarządzenie nr 0050.166.2023 Wójta Gminy Ślemień z dnia 18/12/2023 r. w sprawie zasad polityki rachunkowości i planu kont.  
Wydruk z dn. 03.01.2025 – Kartoteka środków trwałych  
Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych- analityka rejestr 092  
OT nr 48/2024, 49/2024 z dnia 20/09/2024 r, wydruk środki trwałe
4. Oryginały faktur wg wykazu faktur wraz z dowodami zapłaty
5. Umowa nr ZP.271.2.5.2023 z dnia 28/09/2023 (termin: 30.08.2024, 4 874 382,65 zł netto), aneks nr 1 z dnia 5/04/2024 r. (roboty dodatkowe 5 077 740,34 zł nett0)  
Protokół częściowy nr 1 z dnia 08/12/2023 r.  
Protokół częściowy nr 2 z dnia 30/08/2024 r.  
Protokół końcowego odbioru robót z dnia 09/09/2024 r.  
Protokół konieczności nr 1 wykonania robót z dnia 31/10/2023 r.  
Protokół konieczności nr 2 wykonania robót z dnia 15/12/2023 r.  
Protokół konieczności nr 3 wykonania robót z dnia 15/12/2023 r.  
Protokół konieczności nr 4 wykonania robót z dnia 25/01/2024 r.  
Protokół konieczności nr 5 wykonania robót z dnia 15/05/2024 r.  
Kosztorys powykonawczy dołączony do WoP (wartość brutto: 6 245 620,62 zł)  
Dziennik budowy nr 1664/2021 z dn. 30.12.2021 r. (chodnik, kanalizacja deszczowa)  
Dziennik budowy (droga).
6. Umowa ZP.271.1.26.2023 z dnia 28/09/2023 r. (kwota: 33 997 zł) nadzór inwestorski  
Protokoły z dnia 31/10/2023 r., 30/11/2023 r., 29/12/2023 r., 31/01/2024 r., 29/02/2024 r., 29/03/2024 r., 30/04/2024 r., 29/05/2024 r., 28/06/2024 r., 31/07/2024 r., 09/09/2024 r. dot. usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.
7. Mapa z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z dn. 30.08.2024 r.  
Operat kołaudacyjny  
Projekt stałej organizacji ruchu  
Projekt budowlany „Budowa chodnika dla pieszych oraz kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1413 S ul. Krakowskiej w Ślemieniu 8+059- 9+598. Budowa zatoki autobusowej”, styczeń 2019  
Materiały do zgłoszenia- remont drogi powiatowej w miejscowości Ślemień dla zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 1413 S w miejscowości Ślemień od km 8-061 do km 10+798”

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Podpis podmiotu kontrolowanego | Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego                             | Podpisy kontrolujących |
| <i>Jarosław Krzak</i>          | Departament Terenów Wiejskich<br>Kierownik referatu kontrol projektów | <i>Ilona Mazur</i>     |
